



HOCHTIEF



**ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A
MODERNIZACE ČOV**
projekt číslo : 255036

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA
leden 2012

Výtisk 1

HOCHTIEF CZ

Vypracoval: Adam Michalec
Dne 31.1.2012

Podpis:

Přijetí Měsíční zprávy č.10/2012 konečným příjemcem
Dne 2.2.2012 Ing. Martin Staněk

Podpis:

ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV

**OBSAH :**

1. Obecné – základní informace o stavbě
2. Postup prací
3. Fotodokumentace
4. Dodávky materiálu
5. Dodavatelský systém Zhotovitele
6. Předepsané zkoušky a atesty použitých materiálů
7. Nároky objednatele nebo zhotovitele
8. Bezpečnostní statistiky
9. Plnění harmonogramu
10. Fakturace
11. Harmonogram plateb
12. Změnová řízení
13. Změny a úpravy projektové dokumentace
14. Plán prací - harmonogram
15. Propagace projektu

PŘÍLOHY:

- neobsazeno

DISTRIBUCE ZPRÁV:

PŘÍJEMCE	KONTAKTNÍ OSOBA	KS	PARÉ
Investor	Ing. Miroslav Netolický	1	1
Zhotovitel	Adam Michalec	1	2
Správce stavby	Ing. Martin Staněk	1	3



1. Obecné – základní informace o stavbě

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „**ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV**“ za měsíc leden 2012. Také obsahuje oznámení o všech aktivitách Zhotovitele. Tato oznámení jsou uvedena pouze ve *Shrnutí*.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:	ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV	
Projekt číslo:	D60 016	SFŽP: 255036
akceptační číslo:	08018601	
Investor projektu:	Město Moravská Třebová	
Termín zahájení stavebních prací:	8.03.2011	
Termín dokončení díla	31.12.2012	
Řídící orgán:	Ministerstvo životního prostředí	
Zprostředkující subjekt:	Ministerstvo životního prostředí	
Realizační orgán:	Operační program životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR	
Správce stavby:	VRV a.s.	
Zhotovitel stavby:	HOCHTIEF CZ	
Stávající provozovatel:	VHOS a.s.	

SHRnutí

Ve sledovaném období měsíce ledna jsou práce prováděny na všech částech projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“, vyjma části Anenské Údolí. Tato část bude dle platného realizačního HMG zahájena v letošním roce. Na objektu čistírny odpadních vod se pokračovalo v provádění odstraňování vad a nedodělků, nyní je ČOV ve zkušebním provozu. Na objektech kanalizací jsou v částech Boršov a Udánky stále přerušeny práce, od 19.12.2011. Všechny pracovní místa jsou zasypána a udržována a bez jakýchkoli omezení, plně sjízdná.



2. POSTUP PRACÍ

Stav prací na jednotlivých Ucelených částech stavby:

ČOV SO1- SO20; PS1 - PS16

Stavba se nachází v nedaleké obci Linhartice cca 3 km od Města Moravská Třebová a je umístěna v těsné blízkosti toku Třebůvka, která je jejím recipientem.

Modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích umožní napojení nových úseků kanalizace na stávající systém, umožní rovněž budoucí čištění odpadních vod ze Starého Města a z nově napojených úseků kanalizace v Linharticích, a zejména zajistí čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č.229/2007 Sb.

ČOV v Linharticích bude po rekonstrukci i nadále čistit odpadní vody pro město Moravská Třebová, místní výrobní i nevýrobní sféru a přidružené obce.

Nově bude čistírna pro 20 050 EO.

V měsíci Lednu 2012 na ČOV jsou prováděny pouze práce na odstraňování vad a nedodělků. Nyní se ČOV nachází ve Zkušebním provozu, kdy jsou sledovány její parametry čištění. 1x měsíčně se koná Kontrolní den Zkušebního provozu a je veden deník Zkušebního provozu.

SO 33 – Kanalizace Udánky

Na UČS SO33 v měsíci lednu jsou práce pozastaveny a dle platného HMG se obnoví dle klimatických podmínek v měsíci březnu. Tento usek je monitorován zhotovitelem a udržován ve sjízdném stavu.

SO 32 – Kanalizace Sušice

Na UČS SO32 bylo v měsíci lednu postaveno na stoce E-3-1 66,2m; stoka E-6-3-1 realizováno 87m; E-6-3-1-1 82m. Za sledované období 151,2m stok a 5,5m odboček na stoce E-6-3



SO 31– Kanalizace Boršov

Na této ucelené části jsou práce od 15.12.2011 přerušeny s předpokládaným zahájením prací konec února. Usek kde byly prováděny práce je monitorován a udržován ve sjízdném stavu.

2. FOTODOKUMENTACE PRŮBĚHU STAVBY

**SO31- Kanalizace Boršov
práce přerušeny**

**SO33-Udánky
práce přerušeny**

**SO32- Sušice
E - 3 - 1**



ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV



E-6-3-1-1



4. DODÁVKY MATERIÁLU

V měsíci lednu probíhají dodávky veškerých materiálů v souladu s odsouhlasenými seznamy trubních materiálů na část Sušice, kde probíhají práce. Na ostatních úsecích jsou práce i dodávky materiálu pozastaveny.

5. DODAVATELSKÝ SYSTÉM


A. ORGANIZACE TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel stavby, firma Hochtief CZ a. s., odpovídá za kompletní realizaci stavby dle platné SOD s investorem akce, Městem Moravská Třebová.

ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV



SLOŽENÍ TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY

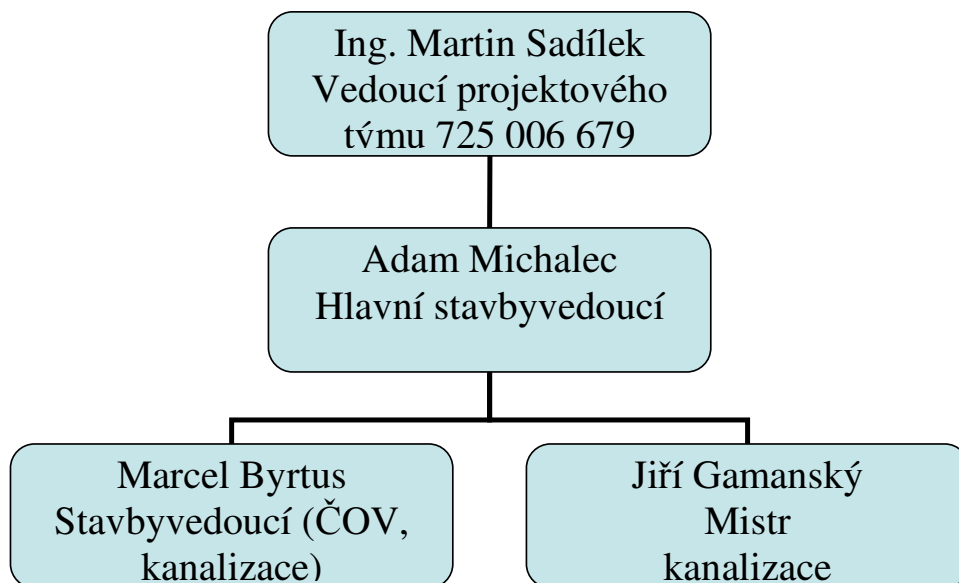

B. PODZHOTOVITELÉ

Podzhotovitelé podílející se na práci na stavbě. Následující tabulka uvádí přehled subdodavatelů:


Přehled subdodavatelů:

Název firmy, (IČO)	předmět práce
DZ Pardubice (259 31 016)	- zajištění dočasného dopravního značení
Ing. Miroslav Najdekr CSc. (111 86 364)	- pasportizace staveb
MATOUŠEK CZ a.s. (277 36 962)	- provádění staveb
Qaliform Slovakia s.r.o. (283 11 060)	- Provozování laboratoří pro zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí
Geodezie Svitavy (135 53 003)	- Výkon zeměměřických činností
Aquaserv s.r.o. (600 71 371)	- monitoring kanalizace a inženýrských sítí
Sdružení PSVS-SYNER	- Zemní práce

Správci stavby byl předán aktualizovaný dodavatelský systém celého projektu.

6. PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY A ATESTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Při provádění veškerých stavebních prací jsou průběžně prováděny veškeré zkoušky k prokázání kvality prováděného díla, a to v počtu a četnostech stanovených tabulkou kontrolního a zkušebního plánu „KZP“ odsouhlaseného dne 22.3.2011.

O provedení těchto zkoušek jsou prováděny zápisy v SD a následně jsou vystaveny samostatné protokoly, které jsou průběžně předávány správci stavby. Předepsané zkoušky jsou prováděny akreditovanou laboratoří.

7. NÁROKY OBJEDNATELE NEBO ZHOTOVITELE

Nejsou známy nové.

8. BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY

Od zahájení prací, respektive od dne předání a převzetí staveniště 8.3.2011, nebyl na stavbě „ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV“ evidován žádný pracovní úraz.



9. PLNĚNÍ HARMONOGRAMU

V měsíci lednu zhotovitel zpracoval aktualizaci HMG, který bude předložen Správci stavby a objednateli. Z HMG se nadále vypouští ČOV, která je ve Zkušebním provozu. Na jednotlivých částech kanalizace se zohlednily nástupy na jednotlivé části po zimním přerušení prací. V aktualizovaném HMG jsou optimalizovány pracovní výkony zhotovitele dle jeho možností a nedochází k výrazným změnám či skluzům v plnění vyjma avizovaných přerušení (stoka D v Udánkách) či nezahájení (protlak v Boršově). Součástí měsíční zprávy zhotovitele je i aktualizovaný realizační HMG.

10. FAKTURACE

Fakturace za období, stejně jako celková rekapitulace fakturace od začátku období, je zřejmá z následující tabulky:

Faktura č.	Datum úhrady	Datum vystavení	Datum splatnosti	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]	Celkem uhrazeno včetně DPH [Kč]
1	4.11.2011	13.5.2011	16.8.2011	4 383 063,60	5 259 676,32	5 259 676,32
2	4.11.2011	9.6.2011	11.9.2011	2.375.493,28	2.850.591,28	2.850.591,28
3	2.11.2011	7.7.2011	10.10.2011	7.865.931,45	9.439.117,74	9.439.117,74
4	8.12.2011	3.8.2011	5.12.2011	8.516.244,88	10.219.493,85	10.219.493,85
5	nehrazeno	15.9.2011	20.1.2012	21.448.194,63	25.737.833,55	0,00
6		18.11.2011	18.2.2012	25.088.966,86	30.106.760,23	0,00
7		9.12.2011	9.3.2012	14.392.827,91	17.271.393,49	0,00
8		15.12.2011	15.3.2012	6.475.315,07	7.770.378,08	0,00
9				1.516.242,66	1.819.491,19	0,00
10				-----	-----	
Σ				92.062.280,34	110.474.735,73	27.768.879,19

Komentář [m1]: Bude doplněno po odsouhlasení FAK

11. HARMONOGRAM PLATEB

Oproti minulému sledovanému období, kdy byl ze strany zhotovitele objednateli předložen aktualizovaný finanční harmonogram, nedošlo ke změně.

12. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

V tomto sledovaném období nedošlo při realizaci díla k dalším novým okolnostem, jež budou mít za následek drobné změny oproti RPD, a tím vyvolané změny ceny díla na dotčených úsecích.

ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV



13. ZMĚNY A ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Drobné změny vyvolané například kolizemi objevených stávajících a funkčních inženýrských sítí s nově budovanou splaškovou kanalizací jsou zdokumentovány jak zápisy ve stavebních denících, pokud se jedná o změny drobného charakteru, tak tvorbou oficiální změnové realizační projektové dokumentace projektantem stavby, pokud se jedná o změnu toto vyžadující. Zhotovitel aktualizoval seznam dosud řešených změn k dispozici pro potřeby provedení ohlášení změn na povolující orgány.

14. PLÁN PRACÍ - HARMONOGRAM

V měsíci lednu došlo k aktualizaci realizačního harmonogramu pro všechny ucelené části kanalizací, který je nyní projednáván se Správce stavby a Objednatelem. V měsíci lednu probíhala realizace pouze v části Sušice, kde to Zhotoviteli umožňovaly místní a klimatické podmínky. Na konci ledna byly práce pozastaveny i na tomto úseku. V měsíci únoru pokud nedojde k výraznější změně klimatických podmínek se obnovení prací nepředpokládá. Zohledněno v HMG.

15. PROPAGACE PROJEKTU

Propagace projektu probíhá současně několika informačními kanály. Informace již byla zveřejněna na webových stránkách Města Moravská Třebová, dále bude použit informační billboard (celkem 1 kus). Zmínka o stavbě je na internetových stránkách společnosti HOCHTIEF (www.hochtief.cz).

V Moravské Třebové, 2.2.2012

Vypracoval: Adam Michalec
hlavní stavbyvedoucí
